

Til
Kommuner i Nordland
v/Ordfører

Fra
Salten Brann IKS
v/ Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brannsjef

Bodø, 27. oktober 2025

UTREDNING OM NY ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN FOR BRANN I NORDLAND (110-TJENESTEN)

Bakgrunn og formål

Vi viser til brev av 1. juli 2025 fra Salten Brann IKS om organisering av nødmeldetjenesten for brann i Nordland (110-tjenesten). 110-tjenesten er pr. i dag underlagt Salten Brann IKS, organisert som Avdeling 110 Nordland. Bakgrunnen for dagens organisering er oppdrag gitt i 2016 fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) til Bodø kommune, om å etablere en nødmeldetjeneste for brann for hele Nordland i samsvar med Politireformens nye distrikter. Bodø kommune valgte da å organisere denne tjenesten inn under Salten Brann IKS.


Som tidligere meddelt, er det framkommet ønsker fra kommuner/regionråd i Nordland om en ny organisering av 110-tjenesten, hvor alle Nordlandskommuner skal inviteres til å bli eiere i et nytt selskap, fortrinnsvis som et interkommunalt selskap, alternativt som aksjeselskap. På bakgrunn av dette, har representantskapet i vedtak av mai 2025, gitt styret i Salten Brann IKS i oppdrag å utrede en ny alternativ organisering av 110-tjenesten. Utredningen vil også omfatte videre prosessplan for etablering av et eget aksjeselskap for salg av automatiske brannalarmer (ABA) tilknyttet 110-sentralen. Her er det allerede gjennomført en rekke utredninger/prosesserarbeid vedrørende forhold angående statsstøtteregelevk, økonomi, skatt og merverdi, organisering mv.

Formålet med dette brevet er å informere om videre prosessplan, samt invitere alle Nordlandskommuner til arbeidet med utredning av mulig ny organisering av 110-tjenesten i Nordland. Kostnadsdekningen av dette arbeidet forutsetter en delfinansiering fra alle kommuner som deltar i utredningen. Vi ber derfor alle inviterte kommuner om å foreta politiske behandling med vedtak om eventuell deltakelse eller ikke, og oversende vedtaksprotokoll til Salten Brann ved daglig leder, innen 1. mars 2026.

Prosjektgjennomføring, overordnet prosessplan

Utredningen av mulig ny organisering av 110-tjenesten i Nordland, planlegges gjennomført som et selvstendig prosjekt, hvor representantskapet i Salten Brann er prosjekteier og med styret i Salten Brann IKS som prosjektets styringsgruppe. Det planlegges å engasjere en ekstern ressurs for løpende prosjektledelse, og hvor et utvalg av Nordlandskommuner utgjør referansegruppen. Endelig prosjektorganisering og prosjektmandat besluttet etter svarfrist Nordlandskommuner (ref. fase 2, figur 2).

Overordnet prosessplan med faser og milepæler er presentert i figur 2 under. Som det framkommer legges det opp til sekvensielle faser med tilhørende milepæler og beslutningspunkt. De enkelte faser er kortfattet beskrevet i vedlegg 1.

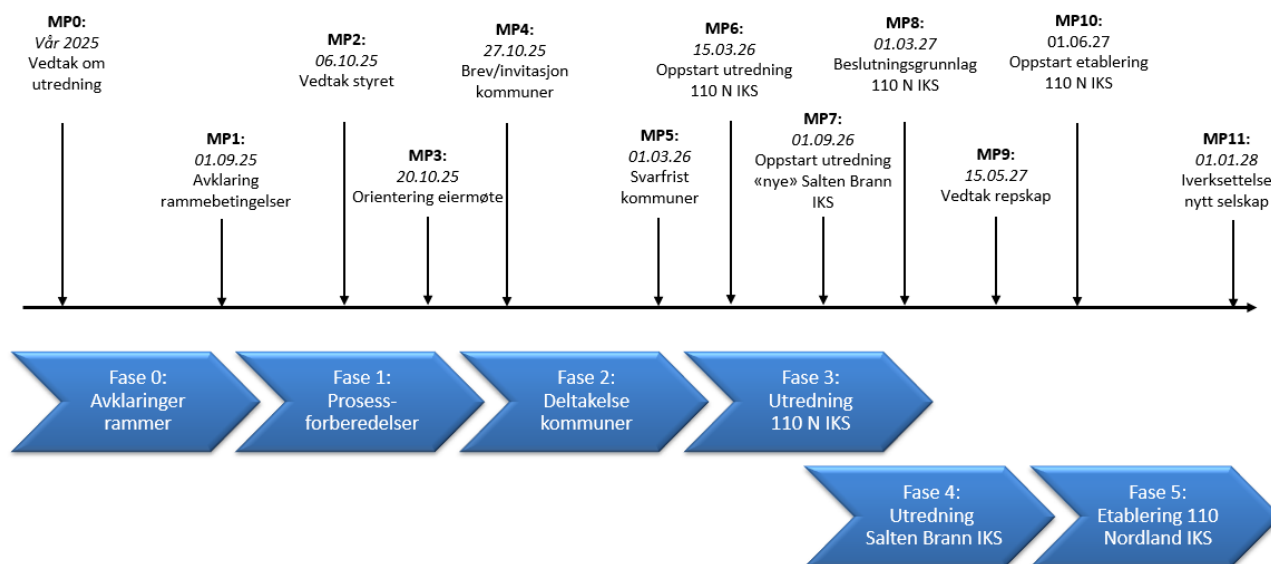

Figur 1 Overordnet prosessplan utredning 110 Nordland IKS

Medvirkning og beslutningsmandat

Det legges opp til en medvirkningsprosess hvor alle Nordlandskommuner som ønsker dette, kan delta i utredningen om ny organisering av 110-tjenesten. Sentralt i det videre arbeidet, er derfor å avklare hvilke Nordlandskommuner som ønsker å delta i denne prosessen. I første omgang gjelder dette deltakelse i selve utredningsarbeidet om et eventuelt 110 Nordland IKS (fig.2, fase 2-3), og i neste omgang hvorvidt kommunene ønsker å gå inn som eiere i IKS-et (fig. 2, fase 5) etter framlagt rapport/beslutningsgrunnlag (fig. 2, MP 8).

I samsvar med prosessplan (fig. 2) er beslutningsmandat som følger:

Beslutningsmandat	Milepæler											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Interessenter		x										
Bodø kommune		x										
Adm/ledelse SB IKS					x		x	x				
Styret SB IKS			x							x		
Repskap SB IKS	x			x						x		
Nordlandskommuner						x			x			
110 N IKS (styre/DL)											x	x

Økonomisk ramme/budsjett utredning

Basert på framlagte prosjekt- og prosessplan (fig. 1 og 2) har foreløpig budsjett for utredningen en total ramme på kr 500.000 for fase 0 til og med fase 4. Kostnadsfordelingen forutsetter en andel pr. deltakende

kommune i henhold til innbyggertall pr. 31.12.2025. Det foreløpige budsjettet må finansieres opp umiddelbart etter svarfrist fra kommunene om deltakelse, dvs. 1. mars 2026 (MP 5).

Avhengig av beslutninger om iverksettelse av etablering 110 Nordland IKS (fase 5), er det foreløpige budsjett for denne del av prosjektet kr 170.000. Også her forutsettes det inndekning av kostnader pr. deltakende kommune i henhold til innbyggertall pr. 31.12.2025.

Videre prosess

Før kommunal behandling inviteres det til digitale informasjonsmøter med Salten Brann IKS hhv. den 21. og 28. november kl. 10 - 11.

Som slutføring av fase 3 utarbeides et beslutningsgrunnlag (ref. MP 9) i egen rapport, hvor på de deltakende kommuner etter dette vedtar hvorvidt man ønsker å gå videre/delta i etableringen av mulig ny organisering av 110-tjenesten, dvs. fase 5.

En eventuell utskillelse av 110-tjenesten fra Salten Brann IKS, vil medføre konsekvenser for selskapet som man pr. i dag ikke har endelig oversikt over. Dette gjelder bl.a. lederressurser, finansiering, kompetanse, ressurser/materiell mv. Disse konsekvenser vil utredes som egen fase (nr. 4), og som sammen med beslutningsgrunnlaget fra fase 3, legges til grunn for endelig vedtak om iverksettelse av fase 5 (etablering av 110 Nordland IKS).
